

Nyt hospitalsbyggeri – Er det klar til klinisk drift?

Udfordringer, løsninger og erfaringer

28. FEBRUAR 2018



Agenda

- Præsentation
- Byggeproces
- Klargøring til indflytning
- Opsummering

Præsentation


Kasper Jørgensen

- Kasper Jørgensen
- Bygherrerådgiver Niras
- Udlånt til Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Skejby
- Rolle i projektet

Byggeproces og udflytningsproces

Byggeproces


- Udflytningsplan
- Byggetidsplan

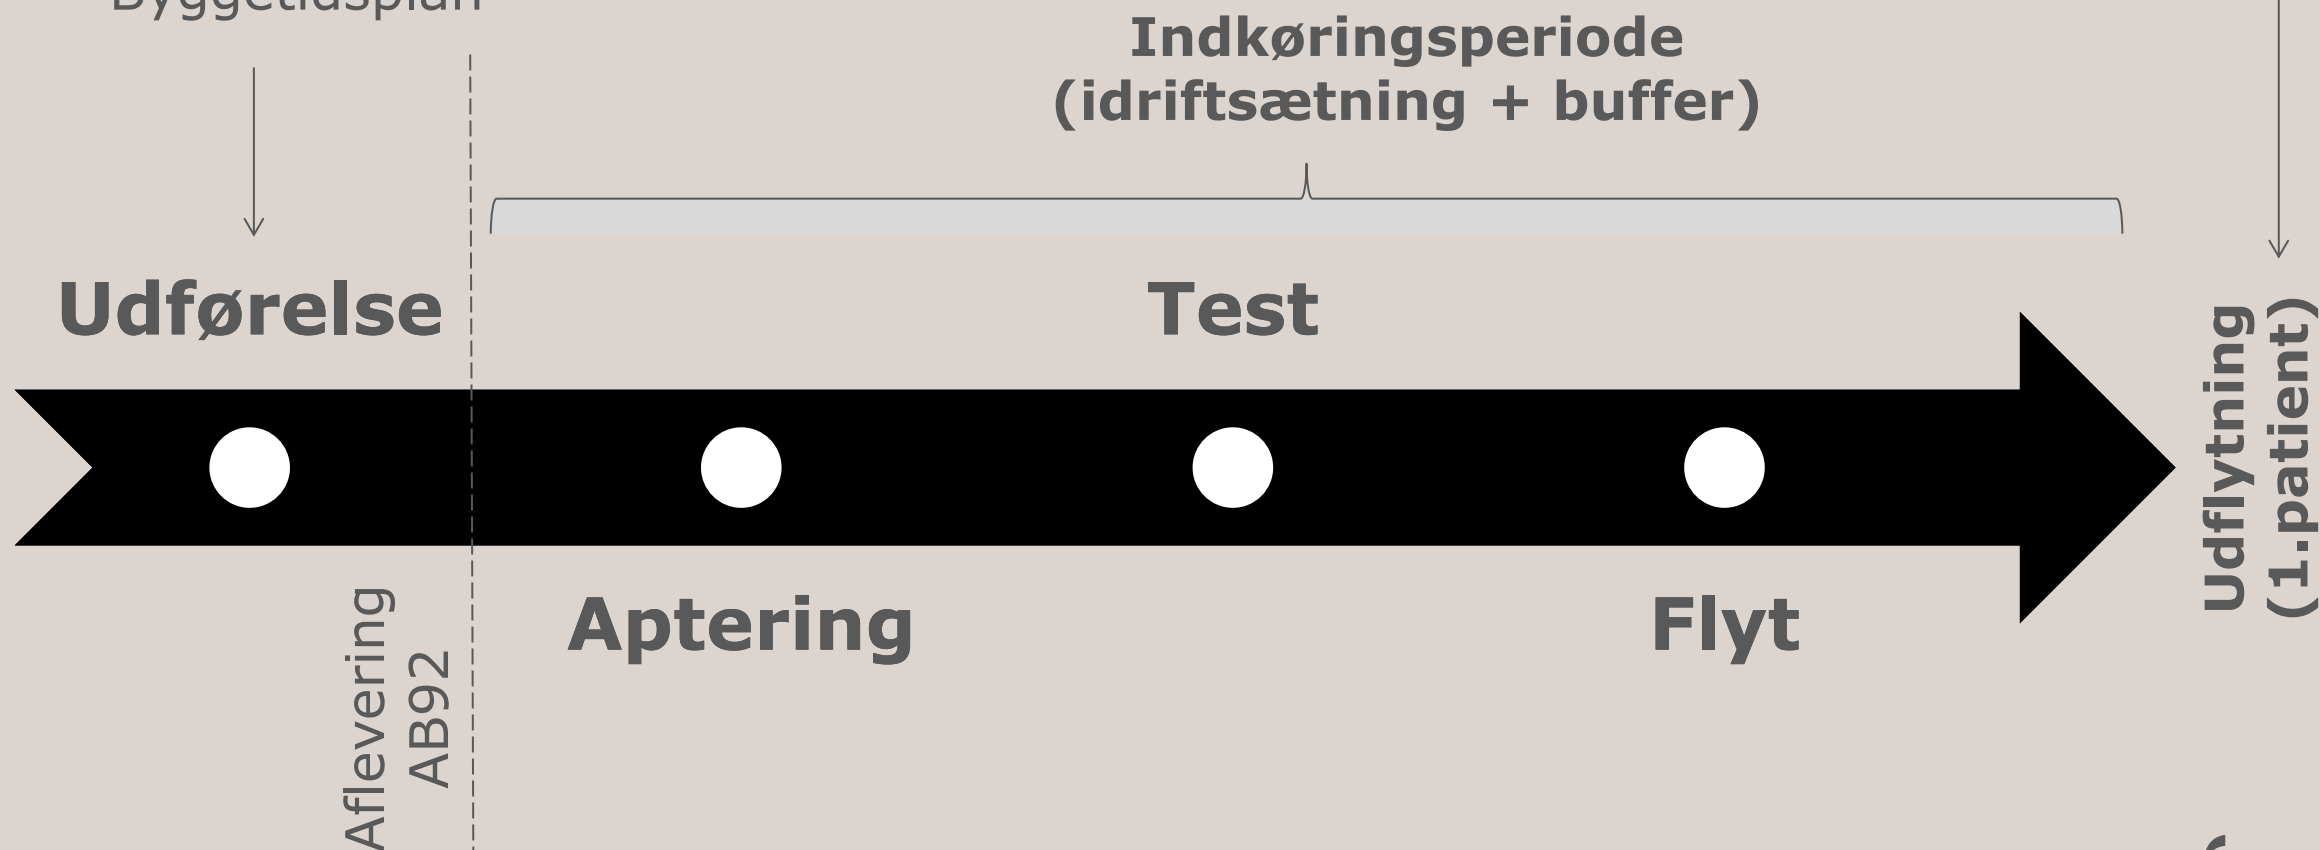

Byggeproces og udflytningsproces

Byggeriets faser - DNU


- Brugerproces / kravsspecifikation
- Projektering
- Udbud og kontrahering
- Udførelse
- Aflevering AB92 -> Drift
- Apterering
- Test og træning
- Flytning
- Klinisk ibrugtagning



4 – 7 år

Byggeproces og udflytningsproces


Kravsspecifikation, metoder og succeskriterier

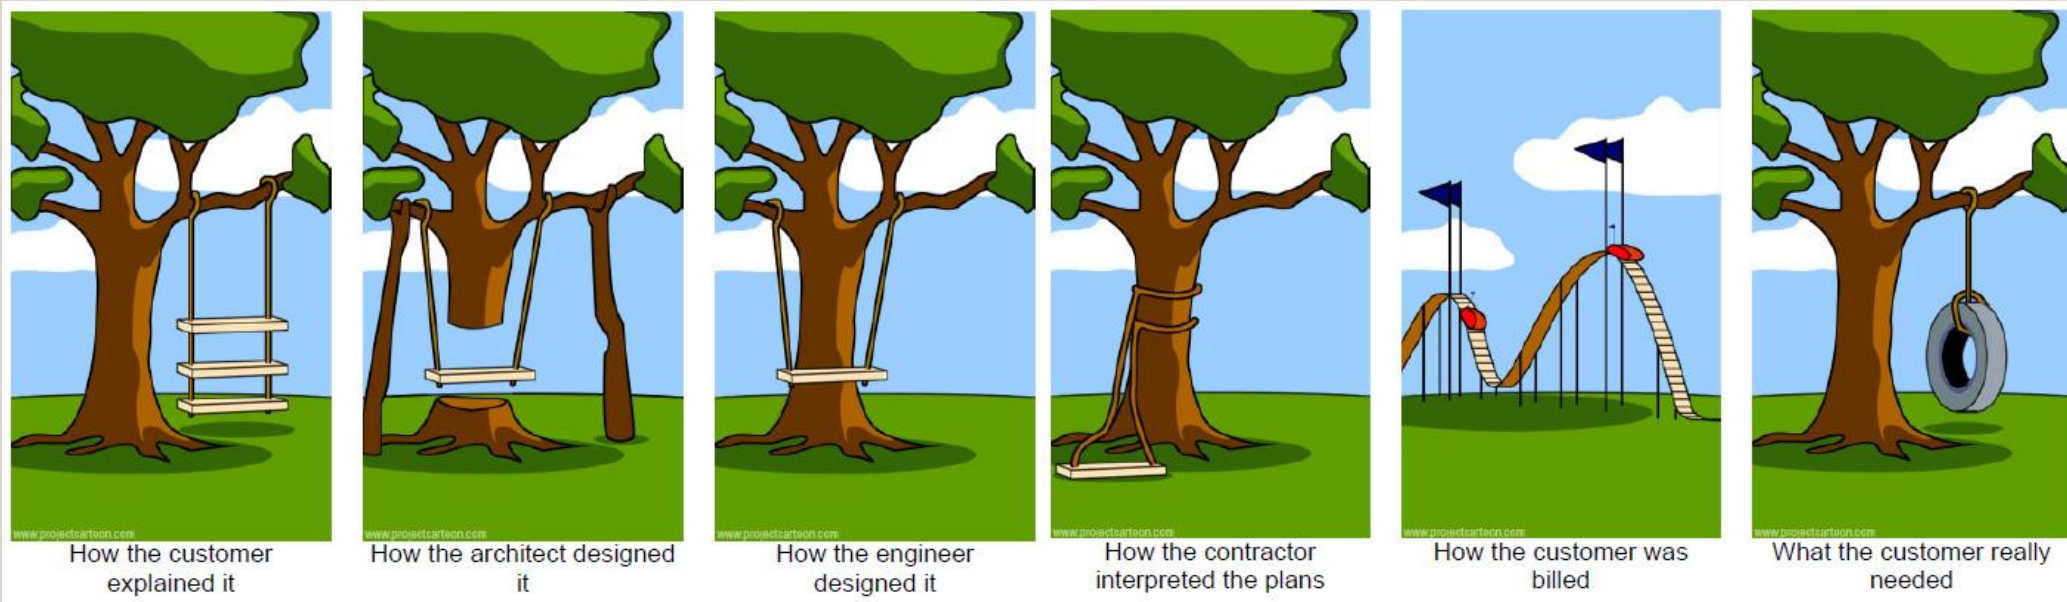

Byggeproces og udflytningsproces

Klargøring til klinisk drift

- Udflytningsplan
- Byggetidsplan

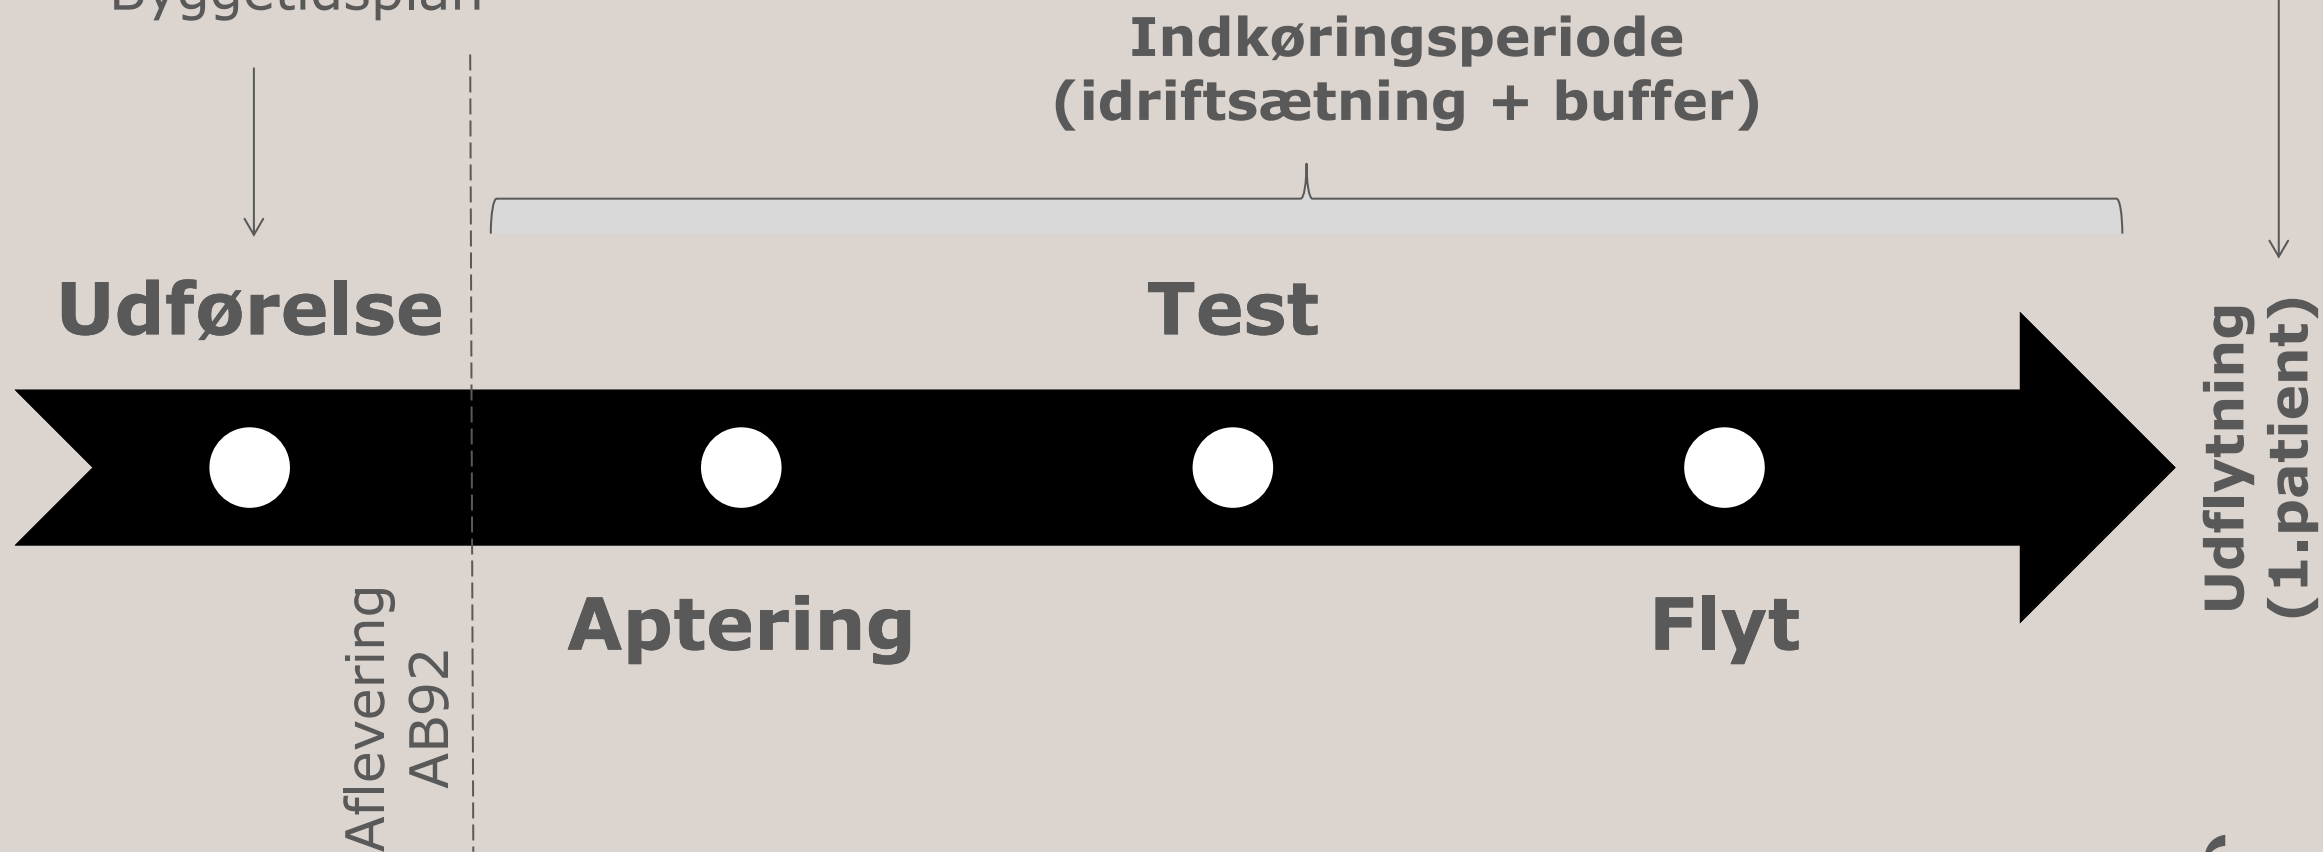

Klargøring til indflytning

Slutspurt

- Driftsorganisationen – Gennemgang af tekniske installationer
- Apterung af bygherreleverancer
- ABC gennemgang
 - A – Mangler i udførelsen
 - B – Ændringer i bygherreleverandørens leverance
 - C – Ændringer fra afdelingen
- Kommandorumsmøder
- Træning i ny fysik

Opsummering

- Gensidig respekt og forståelse for hinandens verdener
- Inddragelse af driftsorganisation
- Testmetoder og succeskriterier
- Planlæg udflytningen i god tid
- Vær opmærksom på ressourcerne



Tak for opmærksomheden

Er der nogen spørgsmål?

